

多伎朝山道路口田儀トンネル外照明工事

工期：平成30年8月8日～平成31年3月29日

竣工検査 工事概要説明書

平成31年 3月 完成



朝畑トンネル



赤谷トンネル



風穴トンネル



出雲多伎IC道路照明



大田朝山IC道路照明



大田朝山 既設分合流

 平松電気工事株式会社

1. 工事概要

1. 工事名称

多伎朝山道路口田儀トンネル外照明工事

2. 路線・工事箇所

一般国道9号 多伎朝山道路
自) 島根県出雲市多伎町 至) 島根県大田市朝山町地内

3. 工 自 平成30年8月8日

至 平成31年3月29日

4. 受注金額

当初 ￥251,640,000-
うち消費税額 ￥18,640,000-
第1回(最終)変更 ￥257,040,000- (増額5,400,000-)
うち消費税額 ￥19,040,000-

5. 受注者


平松電気工事株式会社
岡山市南区福浜町13-28
代表取締役社長 平松 良一
現場代理人 栗原 穂尚
監理技術者 荻沼 昭之信
担当技術者 駿河 佑輔

本工事は、多伎朝山道路朝畑・赤谷・風穴トンネルのトンネル照明設備の設置及び試験調整、出雲多伎IC・大田朝山ICの道路照明設備の設置及び試験調整を行いました。

設備構成


工事場所	工種	設備	数量
(朝畑トンネル 口田儀第1)	分電盤設置工	引込開閉器箱 SUS	1面
	トンネル照明設置工	基本照明 LED 417°ee	46台
		入口照明 LED	164台
		照明盤 屋外防水自立型	1面
		輝度計	2台
		坑外灯	2台
	配管配線工	複合ケーブル等	1式
引込柱設置工	引込柱 CP9m-19cm-5.9kN	2本	
(赤谷トンネル 口田儀第2)	分電盤設置工	引込開閉器箱 SUS	1面
	トンネル照明設置工	基本照明 LED 417°ee	86台
		入口照明 LED	184台
		照明盤 屋外防水自立型	1面
		輝度計	2台
		坑外灯	2台
	配管配線工	複合ケーブル等	1式
引込柱設置工	引込柱 CP9m-19cm-5.9kN	1式	
(風穴トンネル 口田儀第3)	分電盤設置工	引込開閉器箱 SUS	1面
	トンネル照明設置工	基本照明 LED 417°ee	22台
		入口照明 LED	80台
		照明盤 屋外防水自立型	1面
		輝度計	2台
		坑外灯	2台
	配管配線工	複合ケーブル等	1式
引込柱設置工	引込柱 CP9m-19cm-5.9kN	1式	
I 多出 C 伎雲	道路照明設置工	道路照明灯 LED	14基
	配管配線工	CV3.5等	1式
	引込柱設置工	引込柱 CP8m-19cm-4.2kN	1式
	分電盤設置工	照明分電盤 SUS	1面
I 朝大 C 山田	道路照明設置工	道路照明灯 LED	10基
	配管配線工	CV3.5等	1式
	フリンカーライト	据置式2灯型 LED	2台

口田儀エリア（トンネル照明） 全体概要

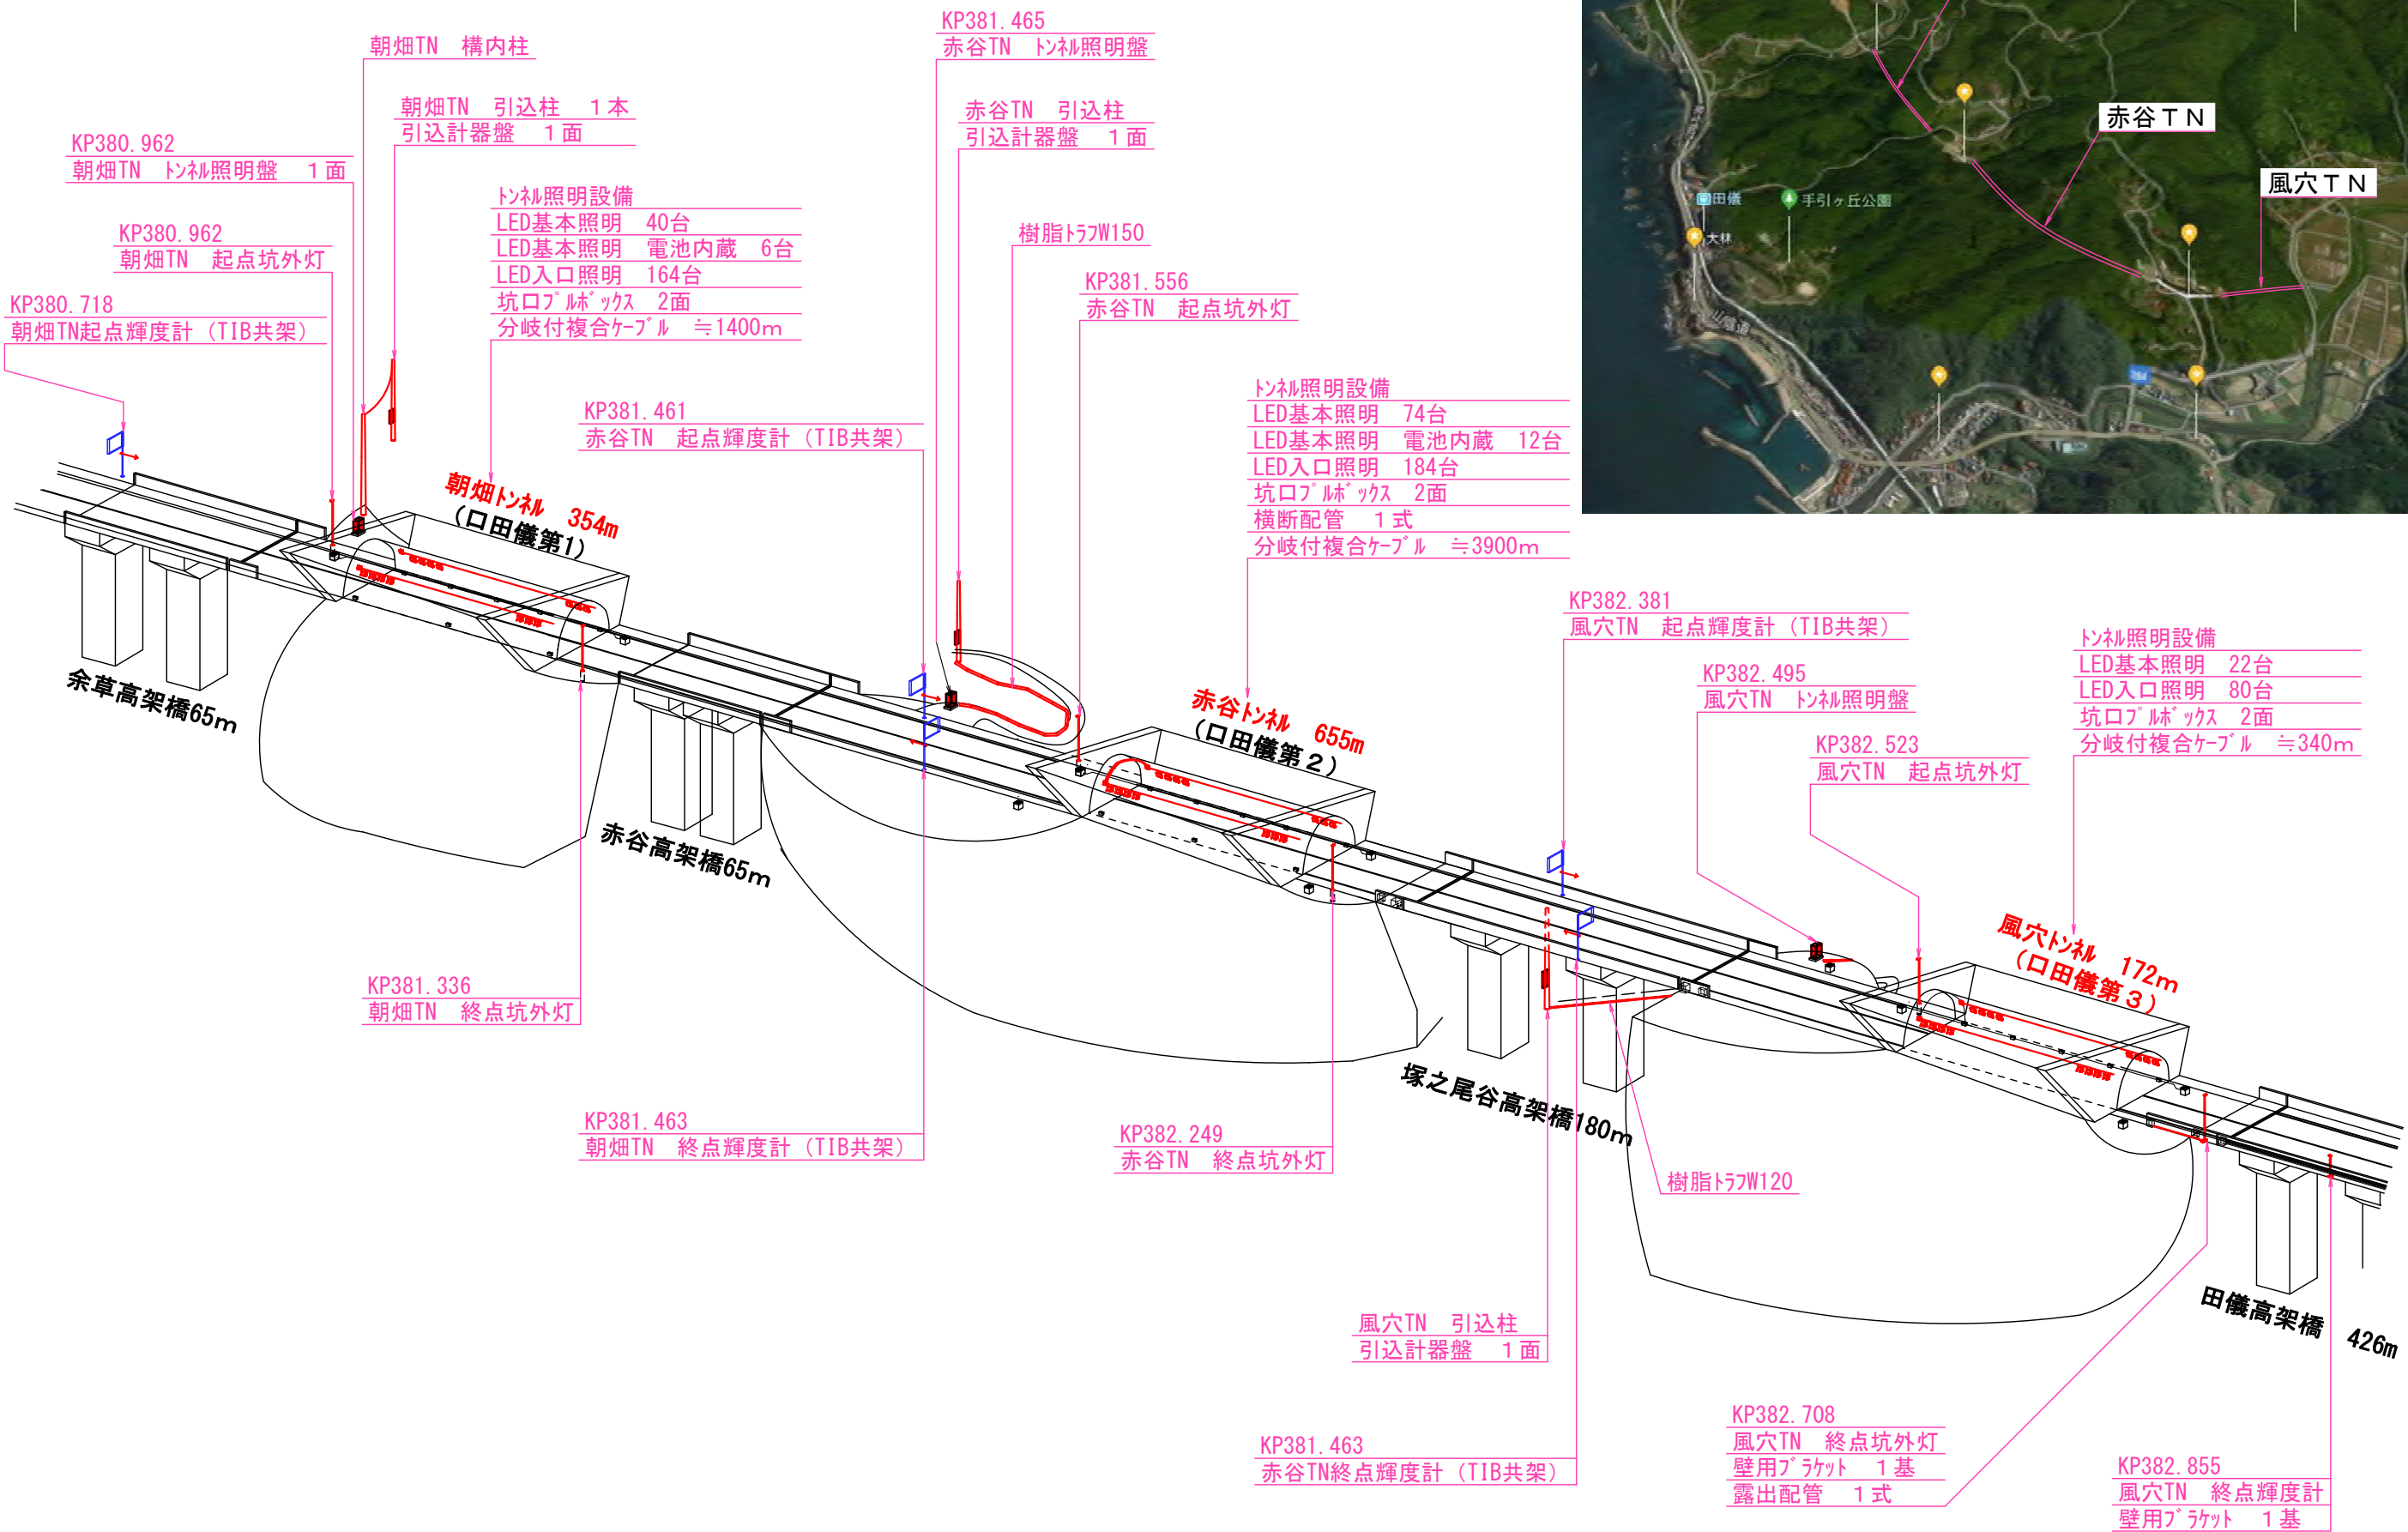

出雲多伎ICエリア 全体概要

出雲多伎IC

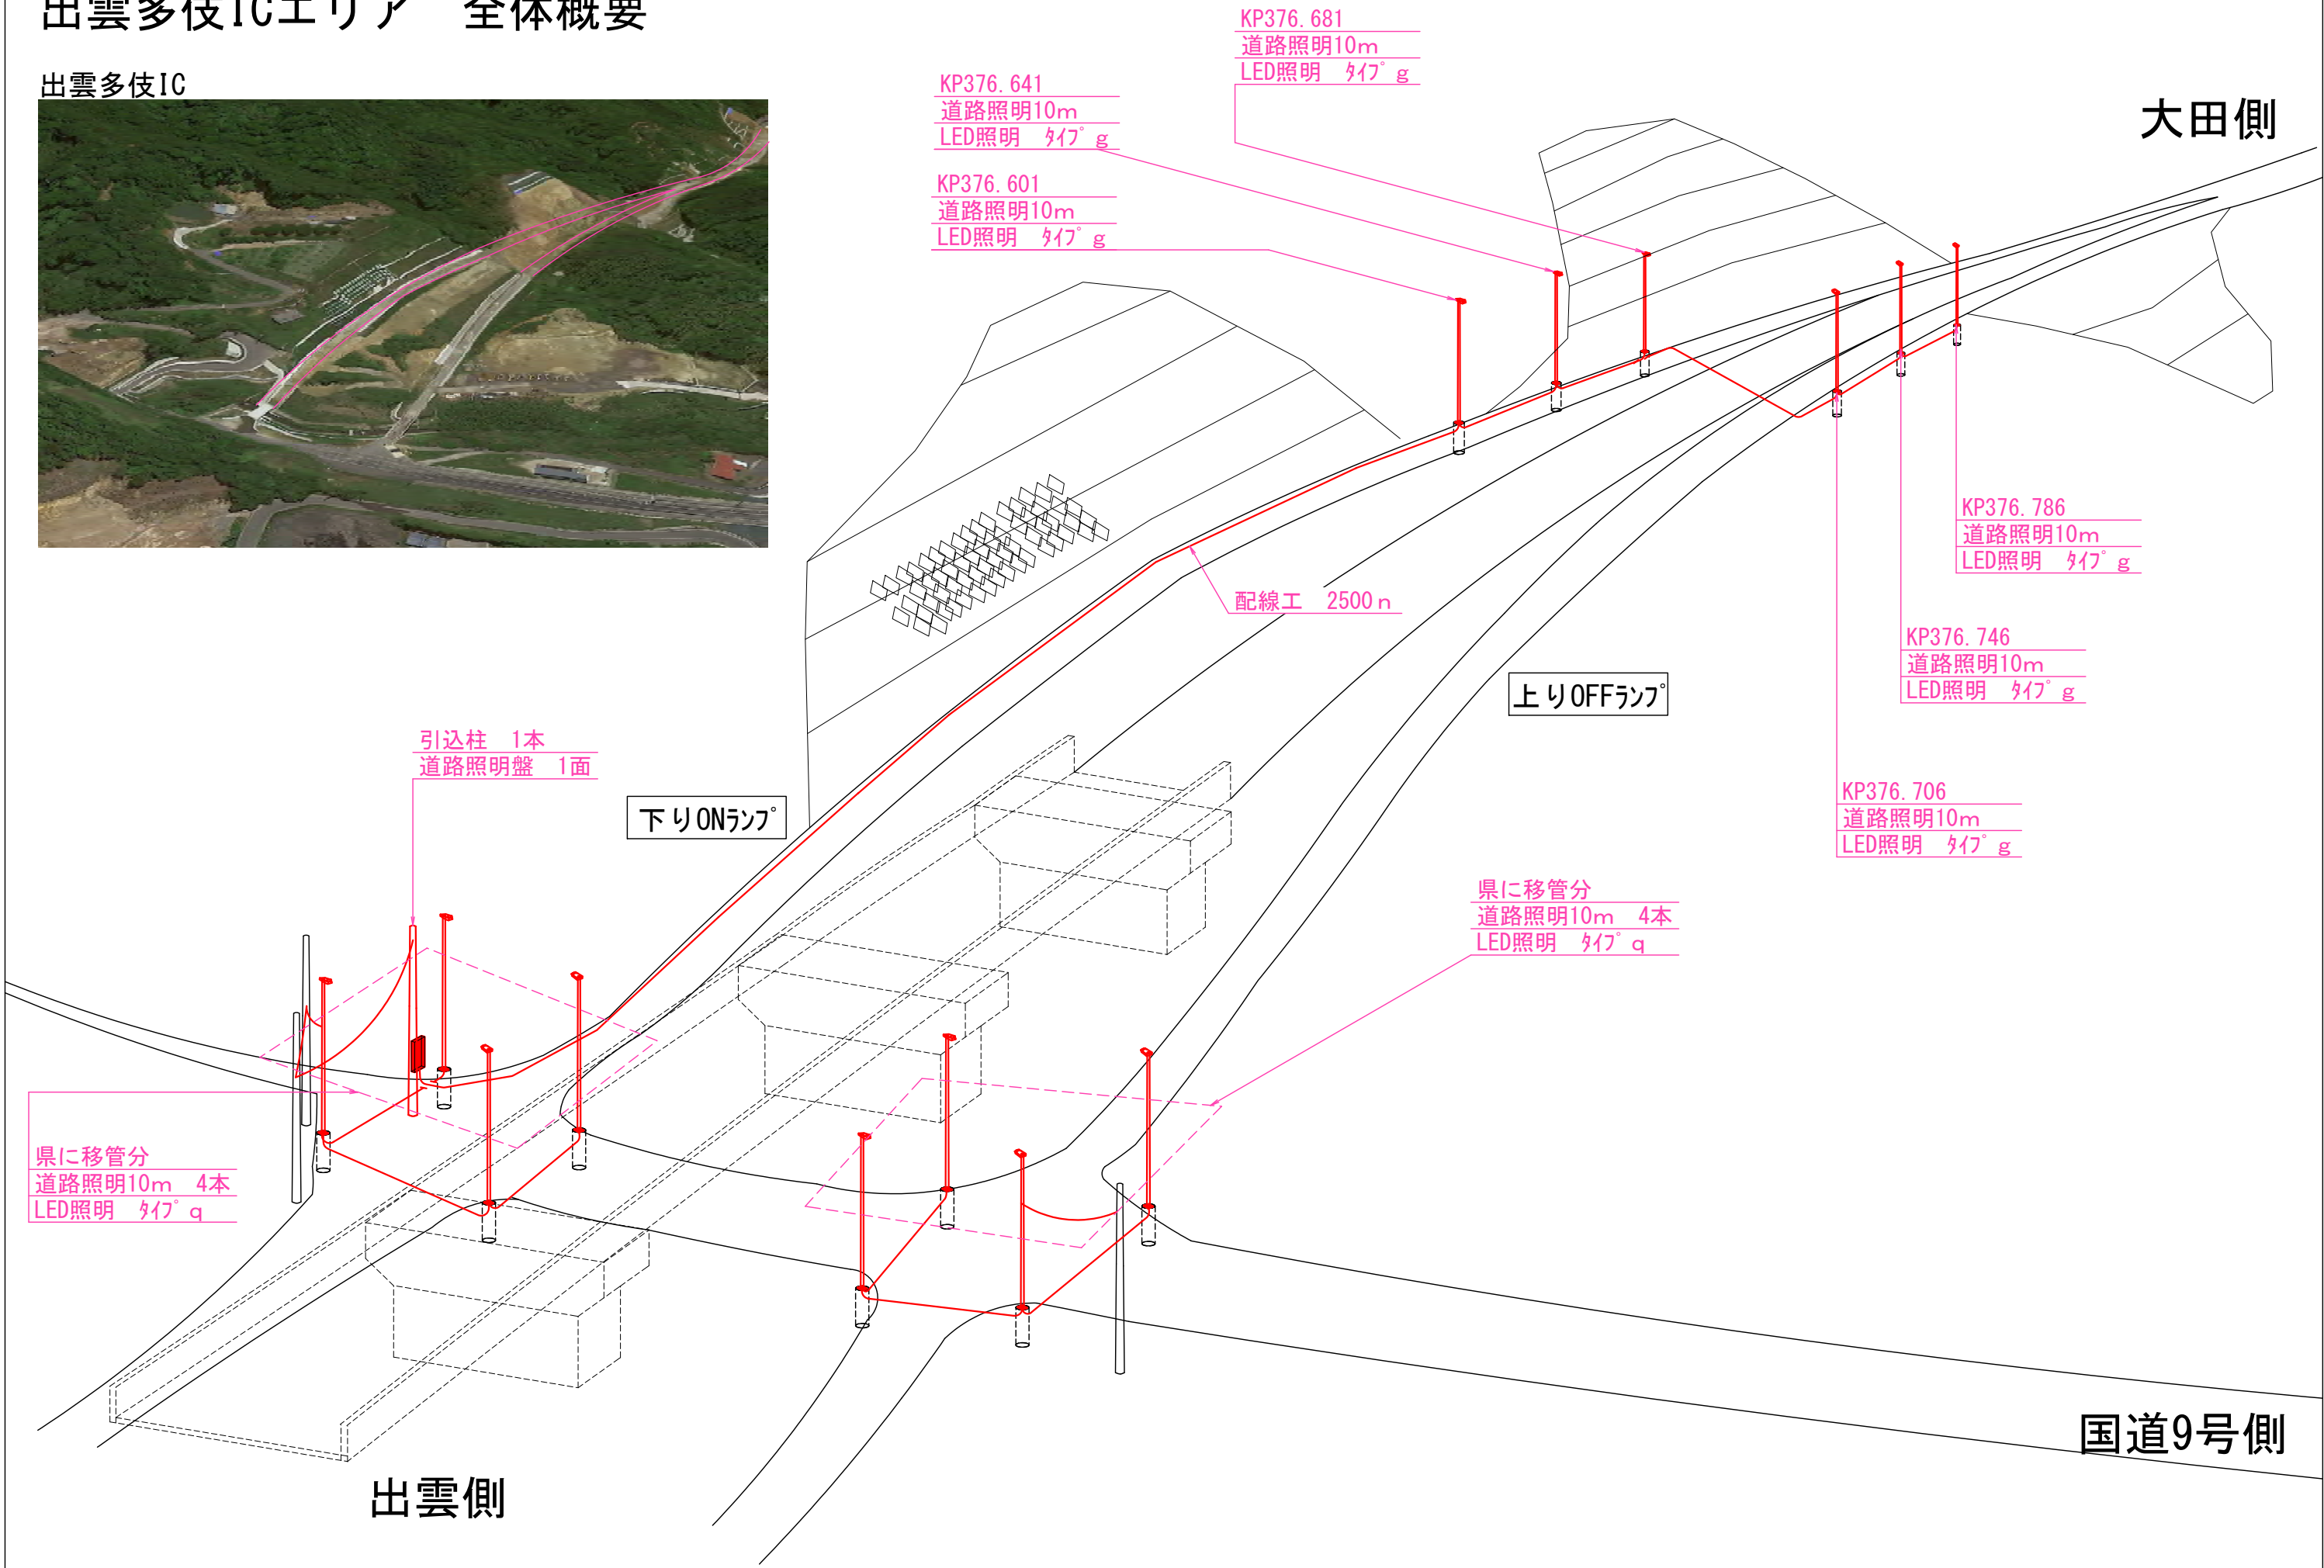

大田朝山ICエリア 全体概要

